



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADHI ROADS CONTRACTING CO. MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com | الهاتف: 0542710479 | الفاكس: 0542710479

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number: كور اسفلت طلب تسليم الرقم التسلسلي: 0000
Date: ٢٠٢٥/٠٥/٢٩ التاريخ
Location: جدة المنطقة
Project Title: مشروع تلال الغروب اسم المشروع
Consultant: مكتب رمك للإستشارات الهندسية الاستشاري
Contractor: شركة طرق الرياض للمقاولات المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

Sketch attached to show the location(s) ☐ Inspection Check list ☐ Surveyor Field Sheet (if any) ☐
كروكي توضيحي للموقع قائمة الفحص سجل إستلام الأعمال المساحية
Approved Shop Drawing ☐ Test Reports (if any) ☐ Others(state) ☐
الرسومات التنفيذية المعتمدة تقارير اختبارات (إن وجدت) أخرى

Discipline: التصنيف ☐ CIVIL ☐ Architectural ☐ Mechanical ☐ Electrical ☐ Other (state) ☐
إنشائي معماري ميكانيكا كهرباء أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت/طبقة ثانية

شارع رقم 01

بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: Designation: Designation: Date: التاريخ: 29/05/2025

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: Designation: Designation: Date: التاريخ: 29/05/2025

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)

Passed مقبول
Failed مرفوض
N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:


ملاحظات مدير المشروع - إستشاري


☒ Approved ☐ Approved with Comments ☐ Comply Comments and Resubmit ☐ Rejected
يتمتع يعتمد بملاحظات معالجوا الملاحظات وإعادة التقديم مرفوض
Name: الاسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: 29/05/2025

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirements
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات						Report No.	PRO-240463.118	
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب						Test Date	29-5-2025	
Location	جدة - حي الأمير فواز						Report Date	31-5-2025	
Location	Block 11						Tested By	Saddam	
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER								
ASPHALT CORES									
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. In Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%) Required Compaction (%)
1	Street 01 STA. 50	5.1	840.2	492.35	845.6	353.25	2.378	2.576	92.3
2	Street 01 STA. 160	5.3	855.5	501.2	861.2	360	2.376	2.576	92.3
3	Street 02 STA. 60	5.4	866.4	510.7	870.3	359.6	2.409	2.585	93.2
4	Street 02 STA. 170	5.5	875.3	515.6	885.2	369.6	2.368	2.585	91.6
5	Street 03 STA. 45	5.4	861.2	504.2	868.7	364.5	2.363	2.591	91.2
6	Street 03 STA. 180	5.5	874.6	512.2	880.5	368.3	2.375	2.591	91.7
7	Street 04 STA. 65	5.1	835.2	492.2	840.6	348.4	2.397	2.582	92.8
8	Street 04 STA. 200	5.3	854.2	504.9	860.3	355.4	2.403	2.582	93.1
	Average Thick.CM	5.3						Average Comp.	92.3



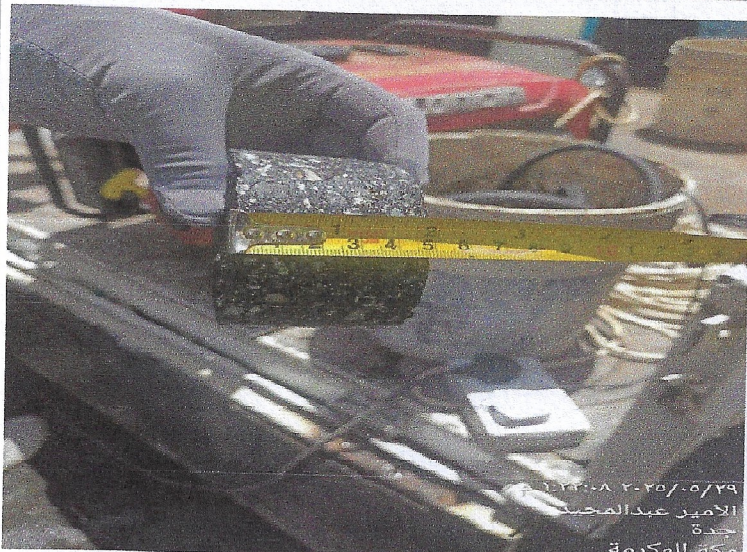

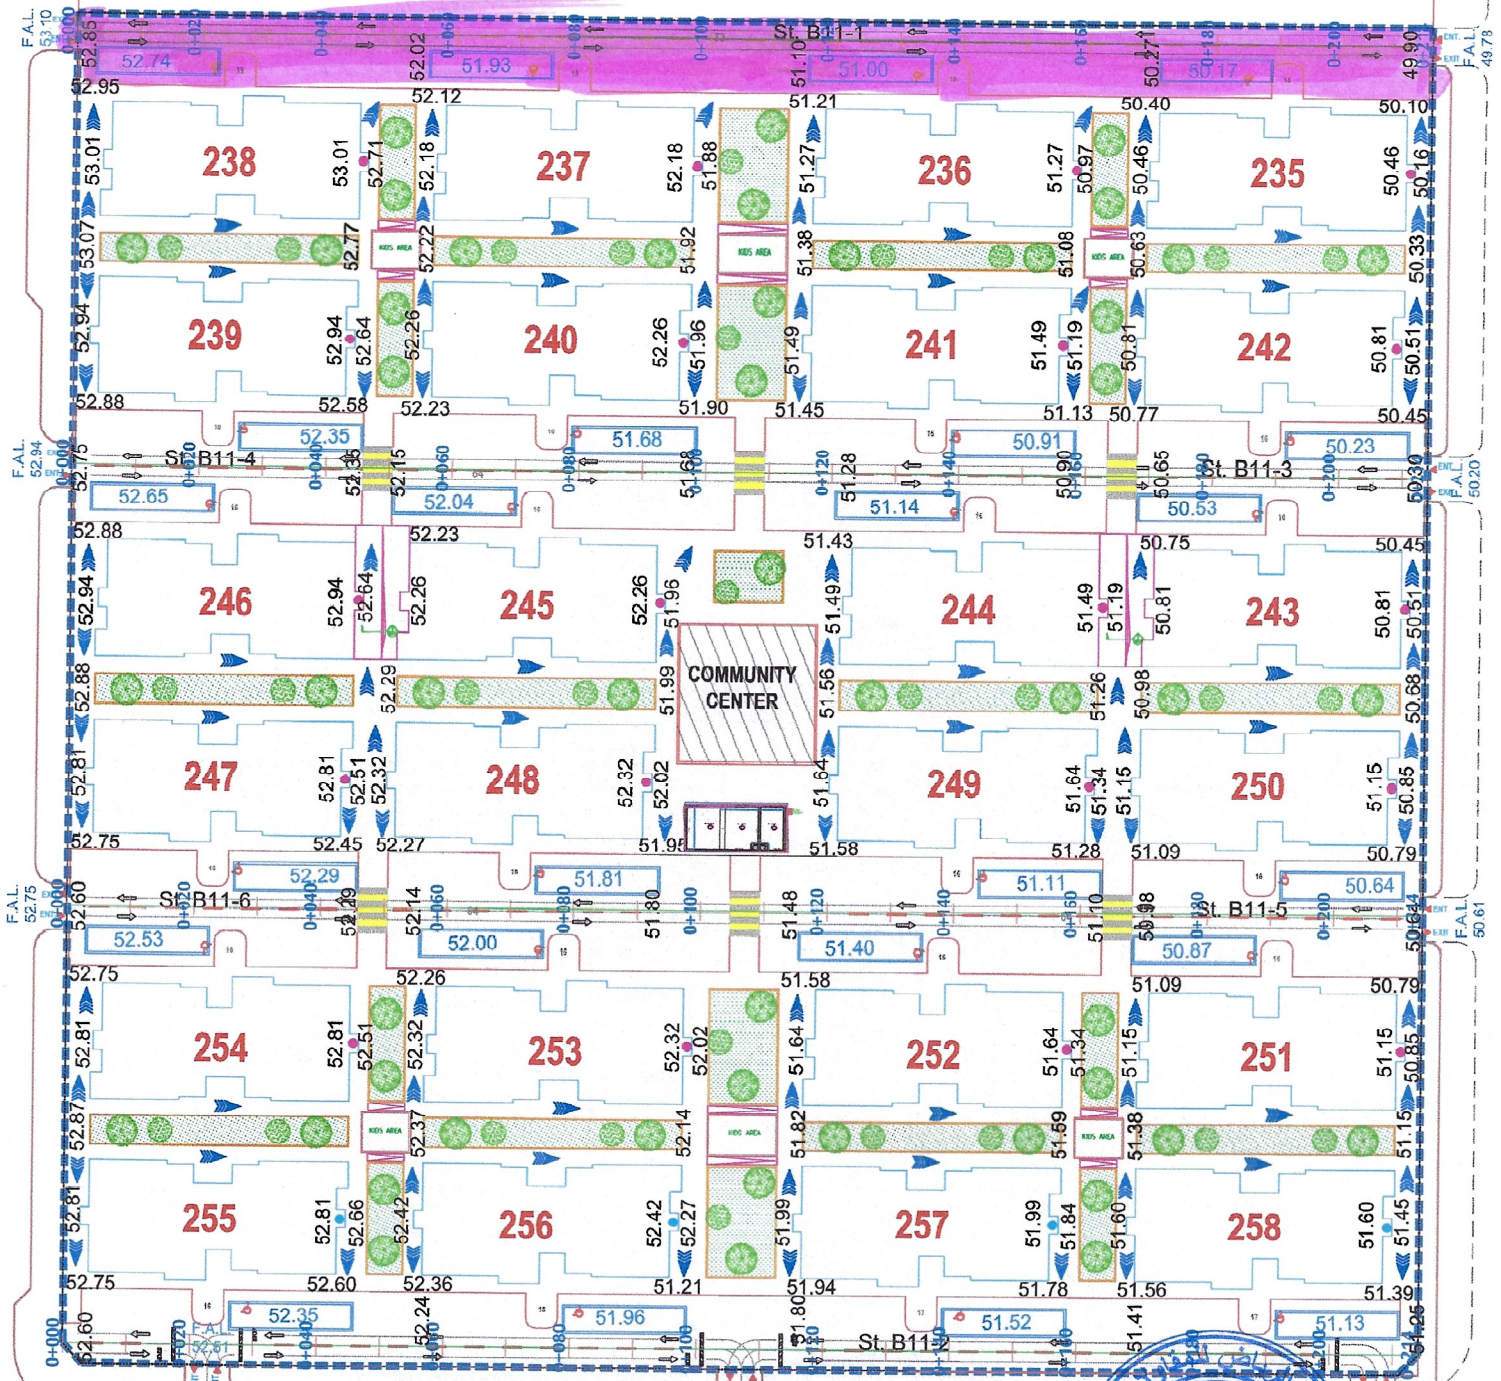

PLOT AREA = 45,616 m2
 TOTAL BUILTUP AREA = 122,544 m2
 FAR = 2.68
 384 UNITS

BLOCK 11

